

# COMUNE DI PORCIA (PN)

## Realizzazione delle rotatorie incrocio via San Antonio Pontebbana e via Roveredo Pontebbana

### PROGETTO DEFINITIVO

R.U.P.:

Michele Stanchina, geometra

#### A.T.I.

CAPOGRUPPO MANDATARIA

MANDANTE

ING. FRANCO BRESCACIN

Via A. Canova, 12 int. 20  
33077 Sacile (PN)  
tel: 0434/72276  
franco.brescacin@libero.it



Società d'ingegneria

Via Campo di Marte, n. 8/A  
06124 Perugia (PG)  
tel/fax 075 / 830563 - 8309014  
info@abacusprogetti.it  
www.abacusprogetti.it



#### STAFF TECNICO

COORDINATORE PROGETTO:  
SICUREZZA:  
PROGETTAZIONE STRADALE:  
IDRAULICA e GEOTECNICA:

Franco Brescacin, ingegnere  
Franco Brescacin, ingegnere  
Maurizio Serafini, ingegnere  
Gabriele Moretti, geometra  
Giulia Fanelli, ingegnere



COMUNE DI PORCIA



## CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

### Cronoprogramma

X0\_RCR01

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
1	7	1	9	D	X0	R	CR	01	03	1719_D_X0_RCR01_03	
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Dicembre 2017			E. Bottone			M. Serafini		M. Serafini		Consegna progetto definitivo
1											
2											
3											

Incidenza  
sicurezza

importo totale  
della categoria

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

3.60%

0.00

73,140.71

30,960.19

1,961.41

37,012.64

16,014.49

269,029.38

13,829.31

38,125.46

0.00

% fase

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%


100.00%

100.00%

inizio	durata	fine	importi parz.	n.	Fasi di costruzione/giorni
0	1	3	0.00	1	Installazione del cantiere
3	16	19	75,772.61	2	Demolizioni e rimozioni
19	7	26	32,074.26	3	Movimenti terra
26	1	27	2,031.99	4	Opere in c.a.
27	8	35	38,344.50	5	Opere di sistemazione idraulica
35	4	39	16,590.76	6	illuminazione
39	56	95	278,710.13	7	Pavimentazioni
95	3	98	14,326.94	8	Impianti
98	8	106	39,497.37	9	Segnaletica orizzontale e verticale
106	1	107	0.00	10	Smobilito cantiere

497,348.56

Cronoprogramma dei lavori

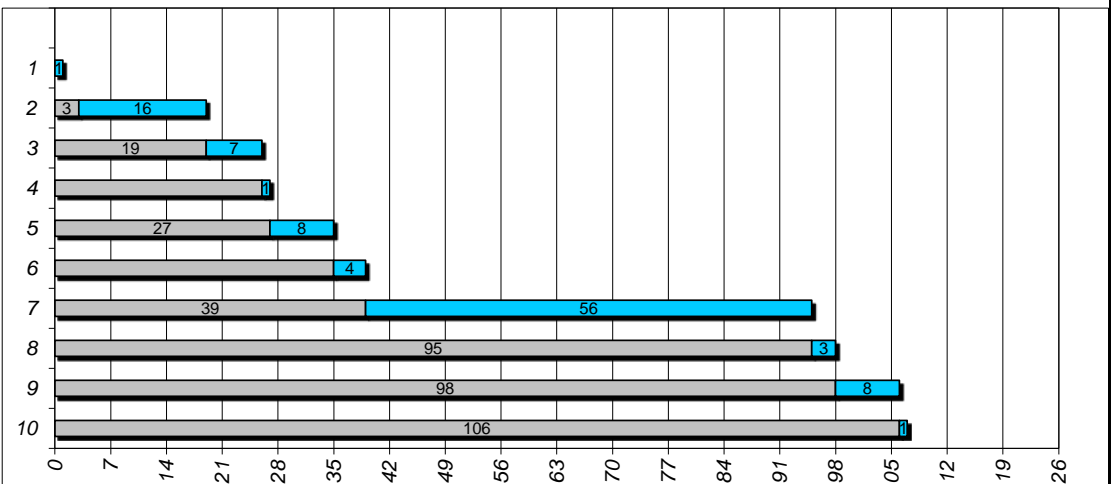

-

4,735.79

4,582.04

2,031.99

4,793.06

4,147.69

4,976.97

4,775.65

4,937.17

-

	giorni	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126
1	Installazione del cantiere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Demolizioni e rimozioni	0.00	18,943.15	52,093.67	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61	75,772.61
3	Movimenti terra	0.00	0.00	0.00	9,164.07	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26	32,074.26
4	Opere in c.a.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99
5	Opere di sistemazione idraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.06	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50	38,344.50
6	illuminazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76	16,590.76
7	Pavimentazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,930.90	49,769.67	84,608.43	119,447.20	154,285.97	189,124.73	223,963.50	258,802.27	278,710.13	278,710.13	278,710.13	278,710.13	278,710.13
8	Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.94	14,326.94	14,326.94	14,326.94	14,326.94
9	Segnaletica orizzontale e verticale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.20	39,497.37	39,497.37	39,497.37
10	Smobilito cantiere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	TOTALI	0.00	18,943.15	52,093.67	84,936.68	114,671.92	148,223.36	179,745.01	214,563.78	249,422.55	284,261.31	319,100.08	353,938.85	388,777.61	423,616.38	457,851.19	492,411.39	497,348.56	497,348.56	497,348.56

b bbb
